


愛媛県立中央病院整備運営事業のうち建設業務

説明会





(1) 建替えの進捗状況について

■ 説明会実施状況

第1回 平成19年 6月12日（火） 19：00～

場所：県立中央病院 講堂

出席された住民の皆様：69名

第2回 平成20年10月31日（金） 19：00～

場所：県立中央病院 講堂

出席された住民の皆様：53名

第3回 平成20年12月18日（木） 19：00～

場所：県立中央病院 講堂

出席された住民の皆様：31名

■ 建築工事関係者連絡会議実施状況


(協議会成立前)

- ・平成20年12月25日(木) 16:00～ 県立中央病院 研修棟 会議室
- ・平成21年 2月12日(木) 16:00～ 県立中央病院 講堂

(建築工事関係者連絡協議会)


- | | | | |
|-----|----------------|--------|---------------|
| 第1回 | 平成21年 4月20日(木) | 16:00～ | PET-CTセンター会議室 |
| 第2回 | 平成21年 8月 7日(金) | 14:00～ | 大成建設現場事務所会議室 |
| 第3回 | 平成21年12月24日(木) | 15:00～ | 大成建設現場事務所会議室 |
| 第4回 | 平成22年 4月 7日(水) | 16:00～ | 大成建設現場事務所会議室 |

■ 工事概要

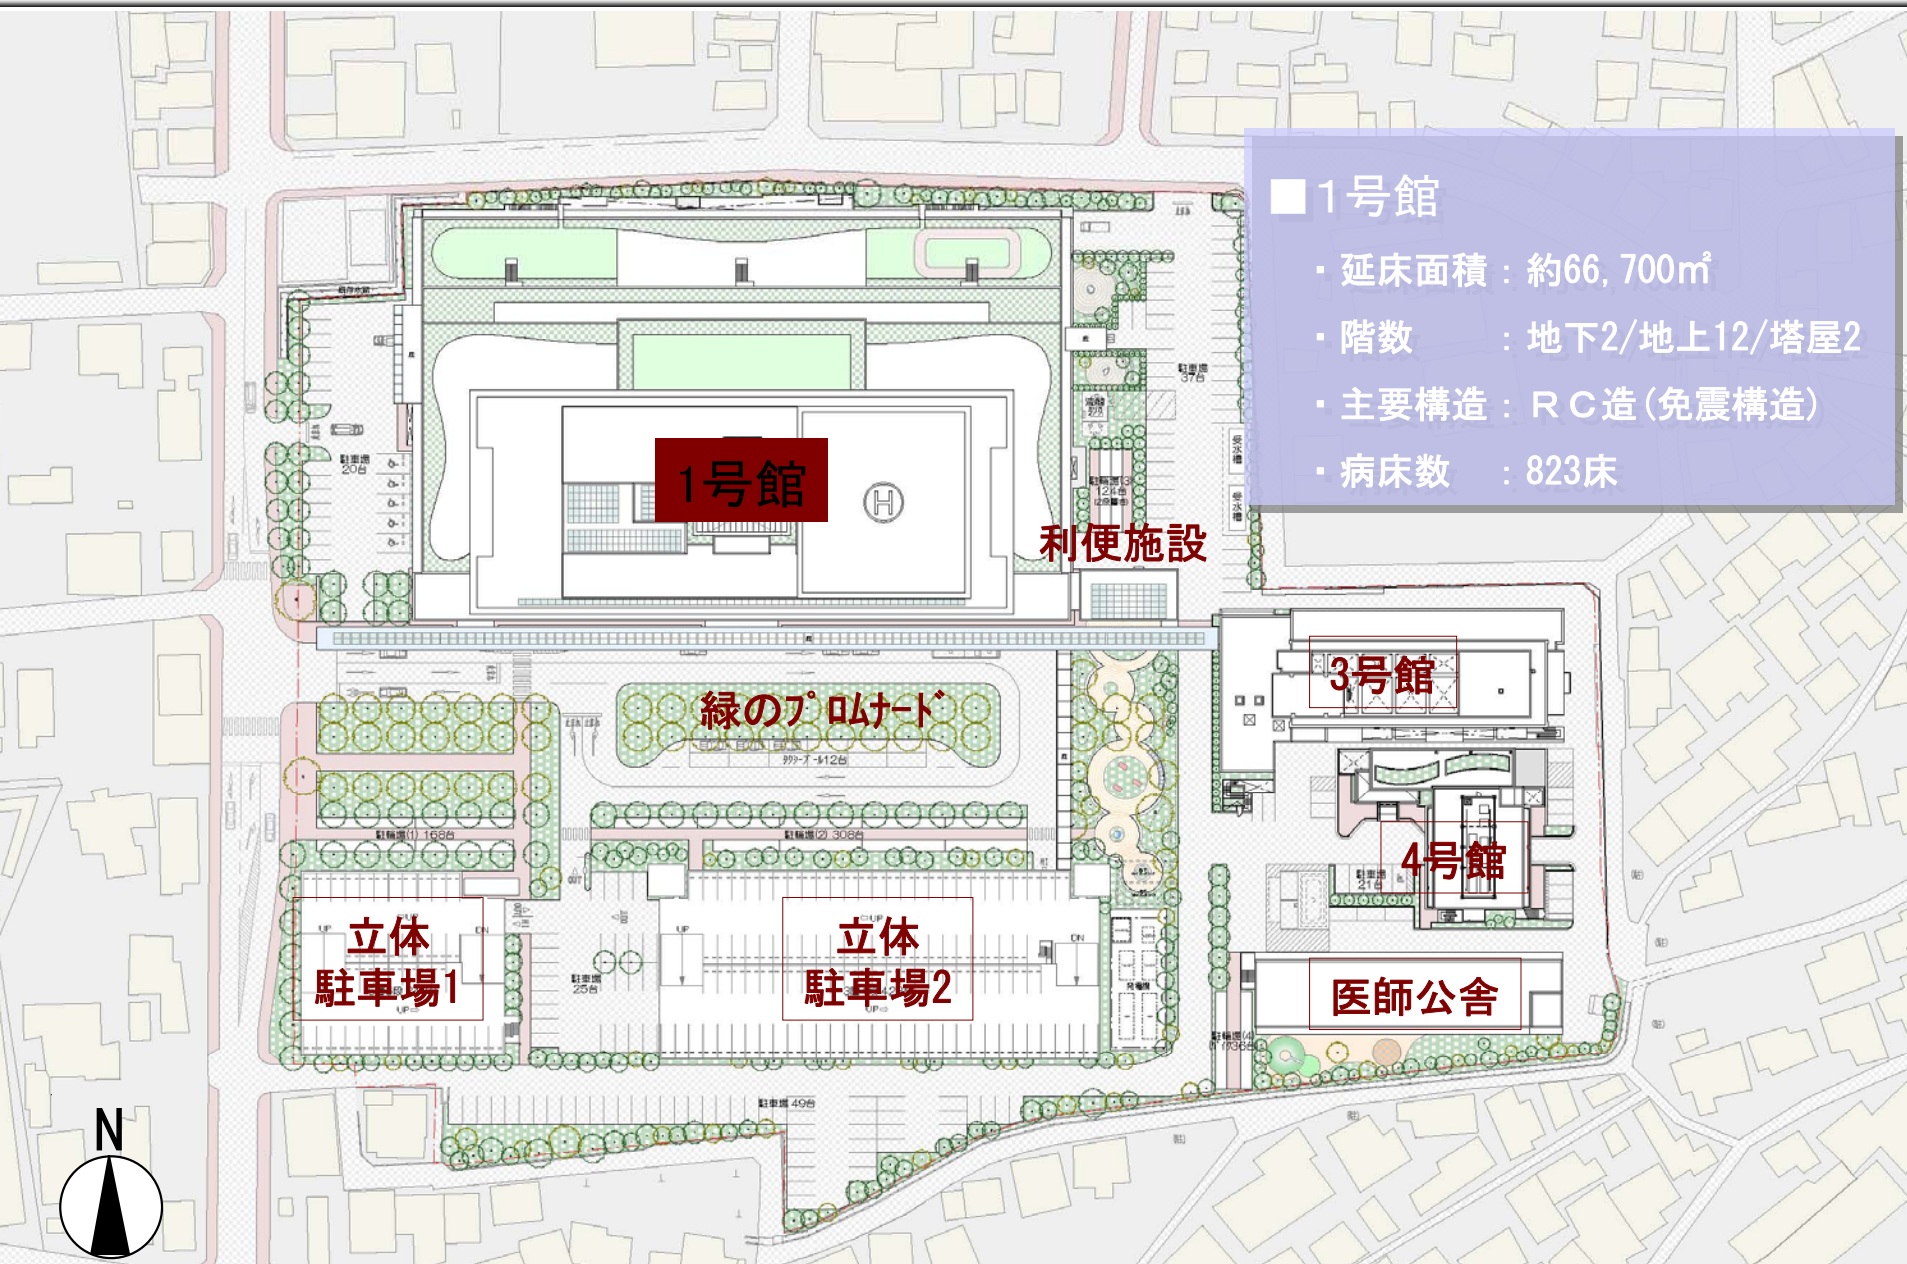


※本図は、提案イメージであり、実際とは異なる場合があります。

■ 工事概要

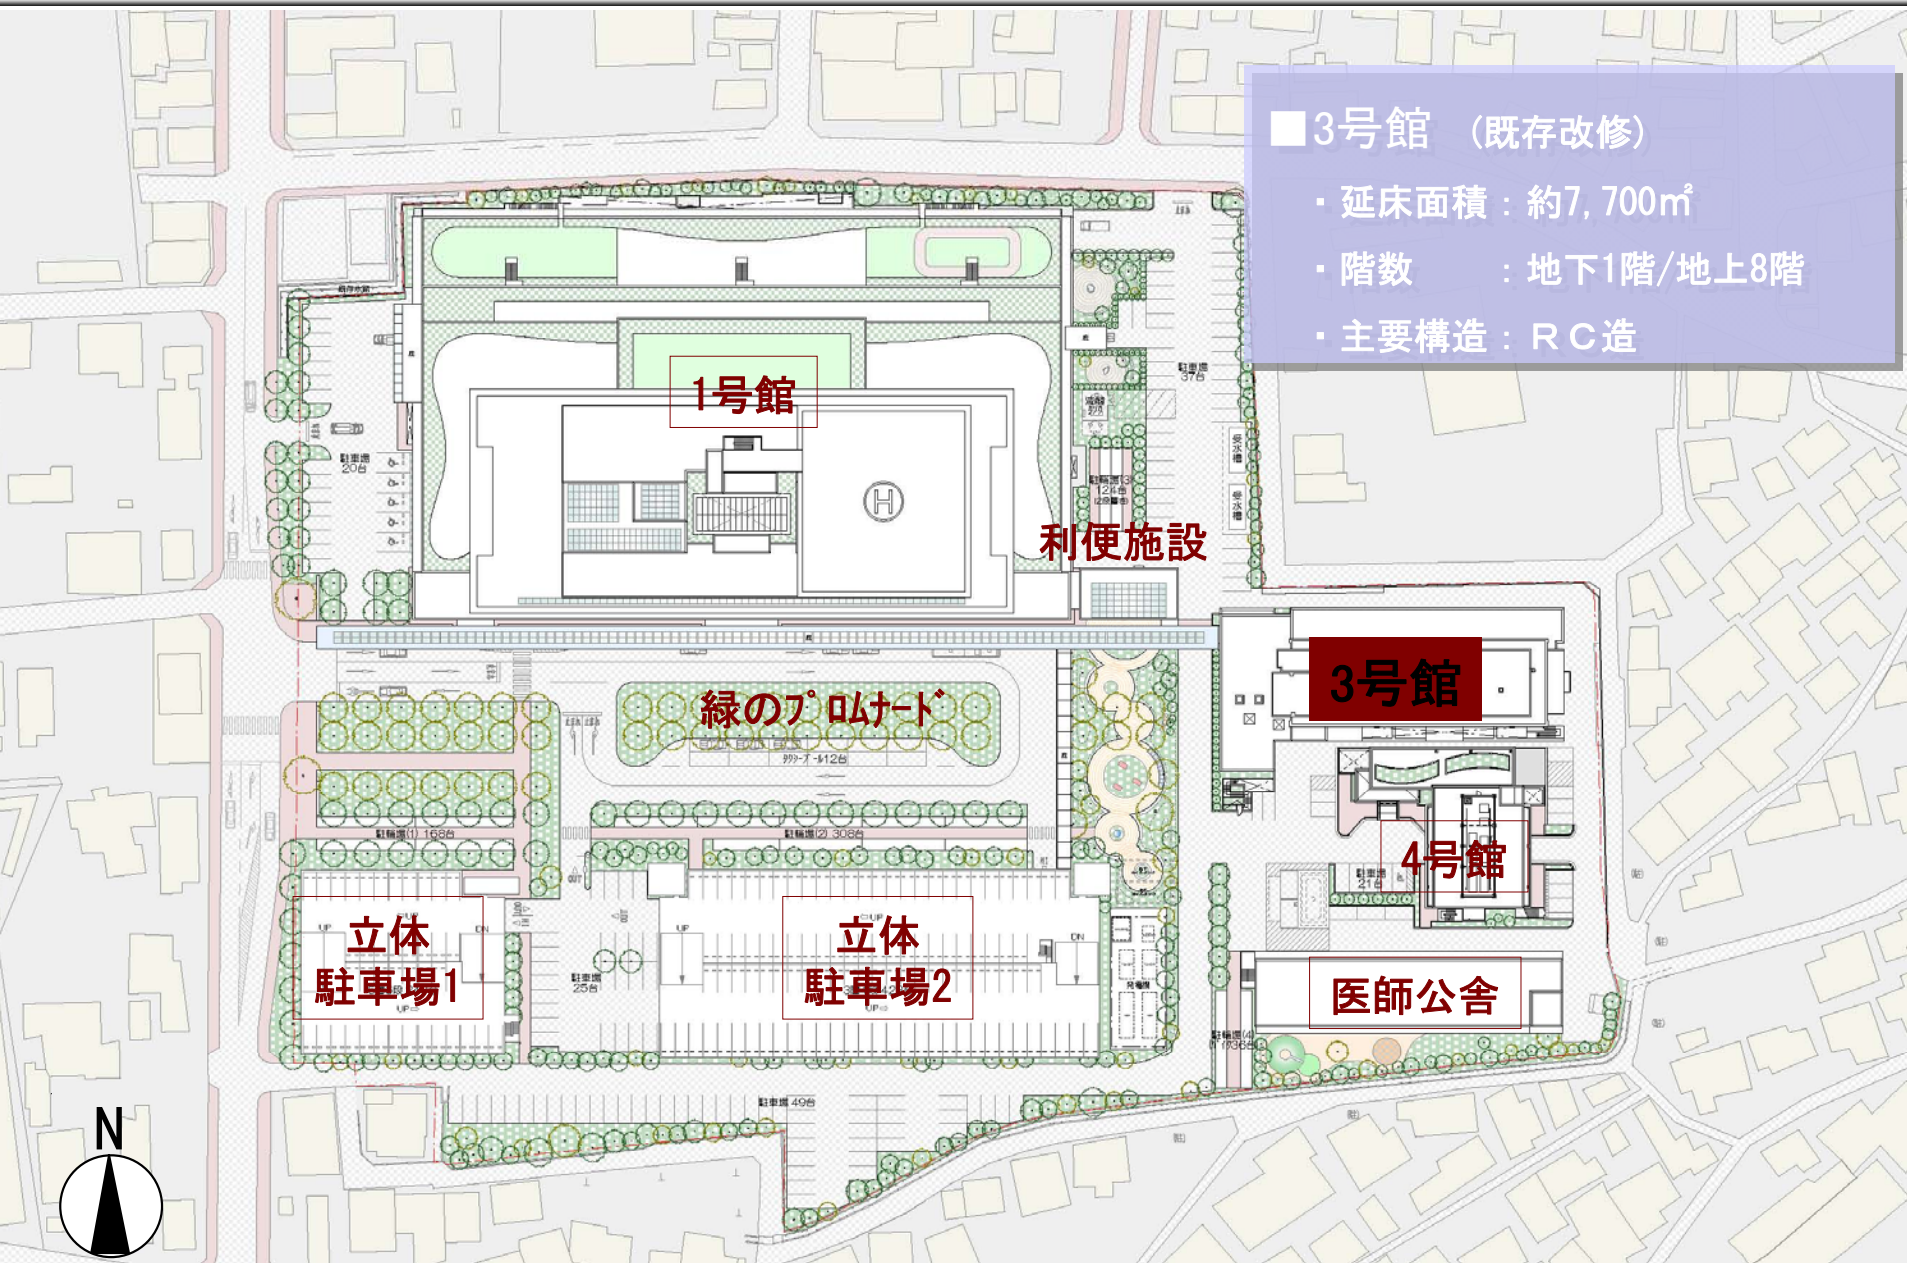


※本図は、提案イメージであり、実際とは異なる場合があります。

■ 工事概要

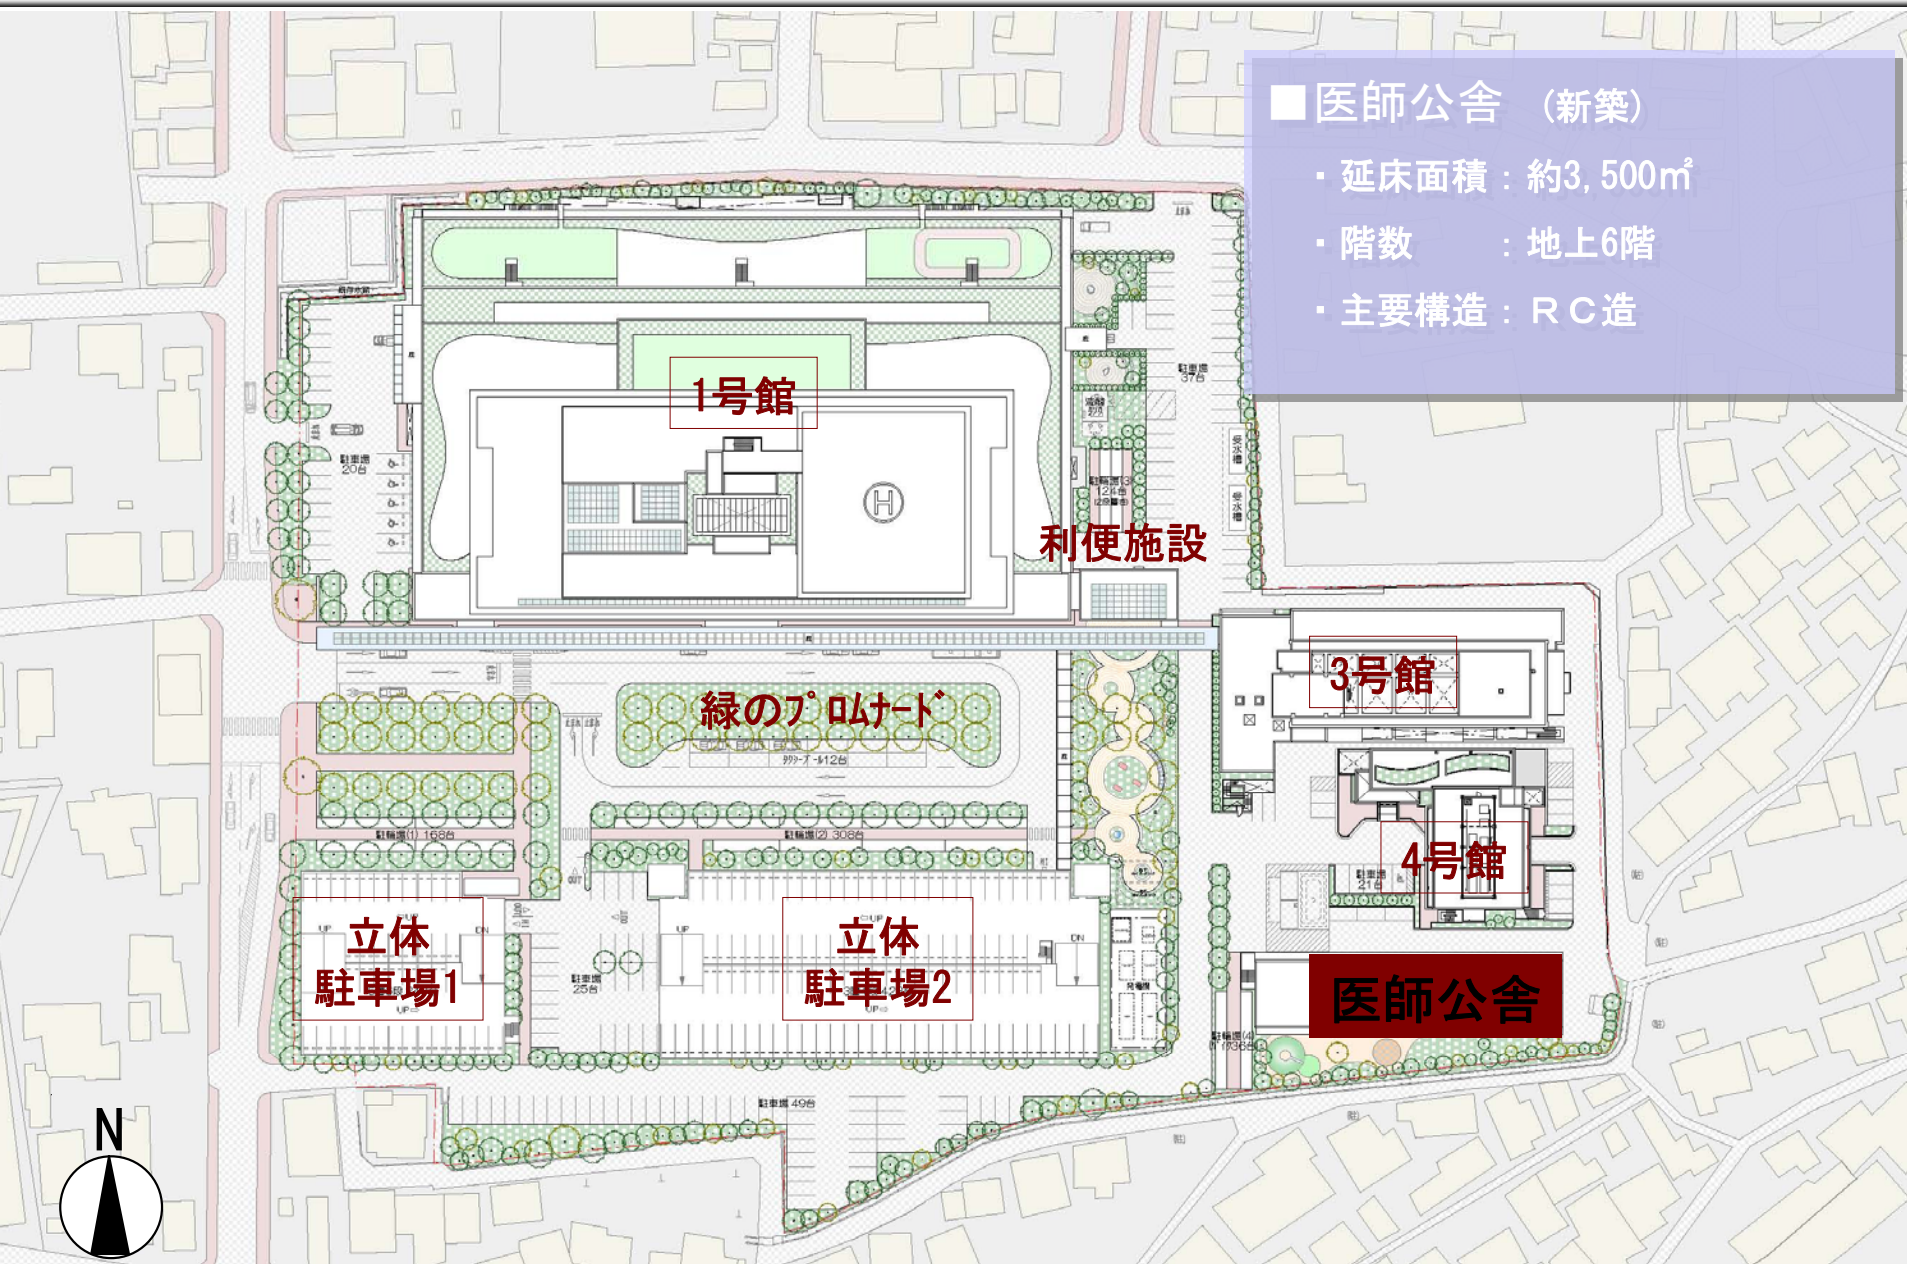


※本図は、提案イメージであり、実際とは異なる場合があります。

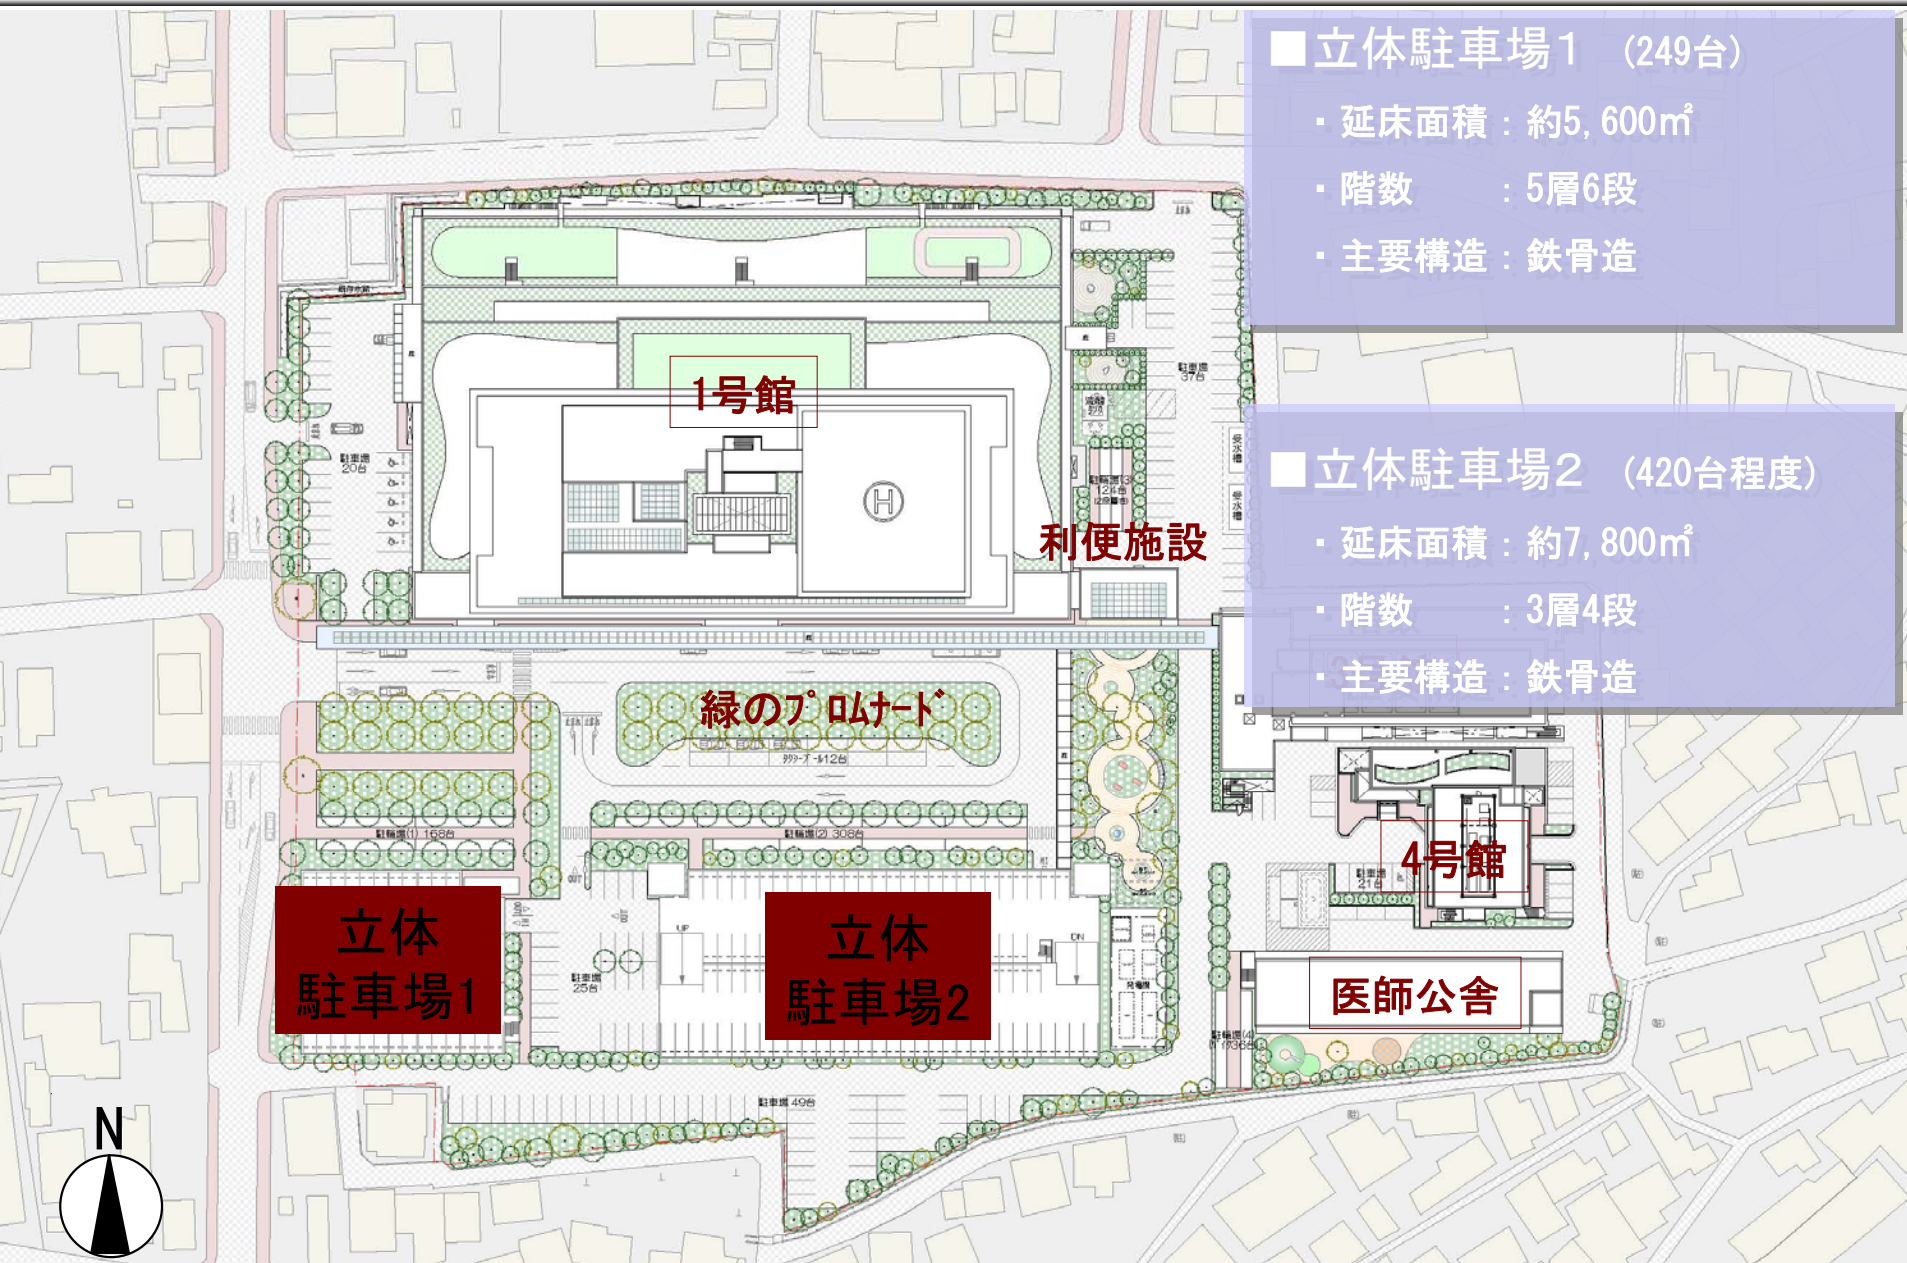







■ 全体工程表

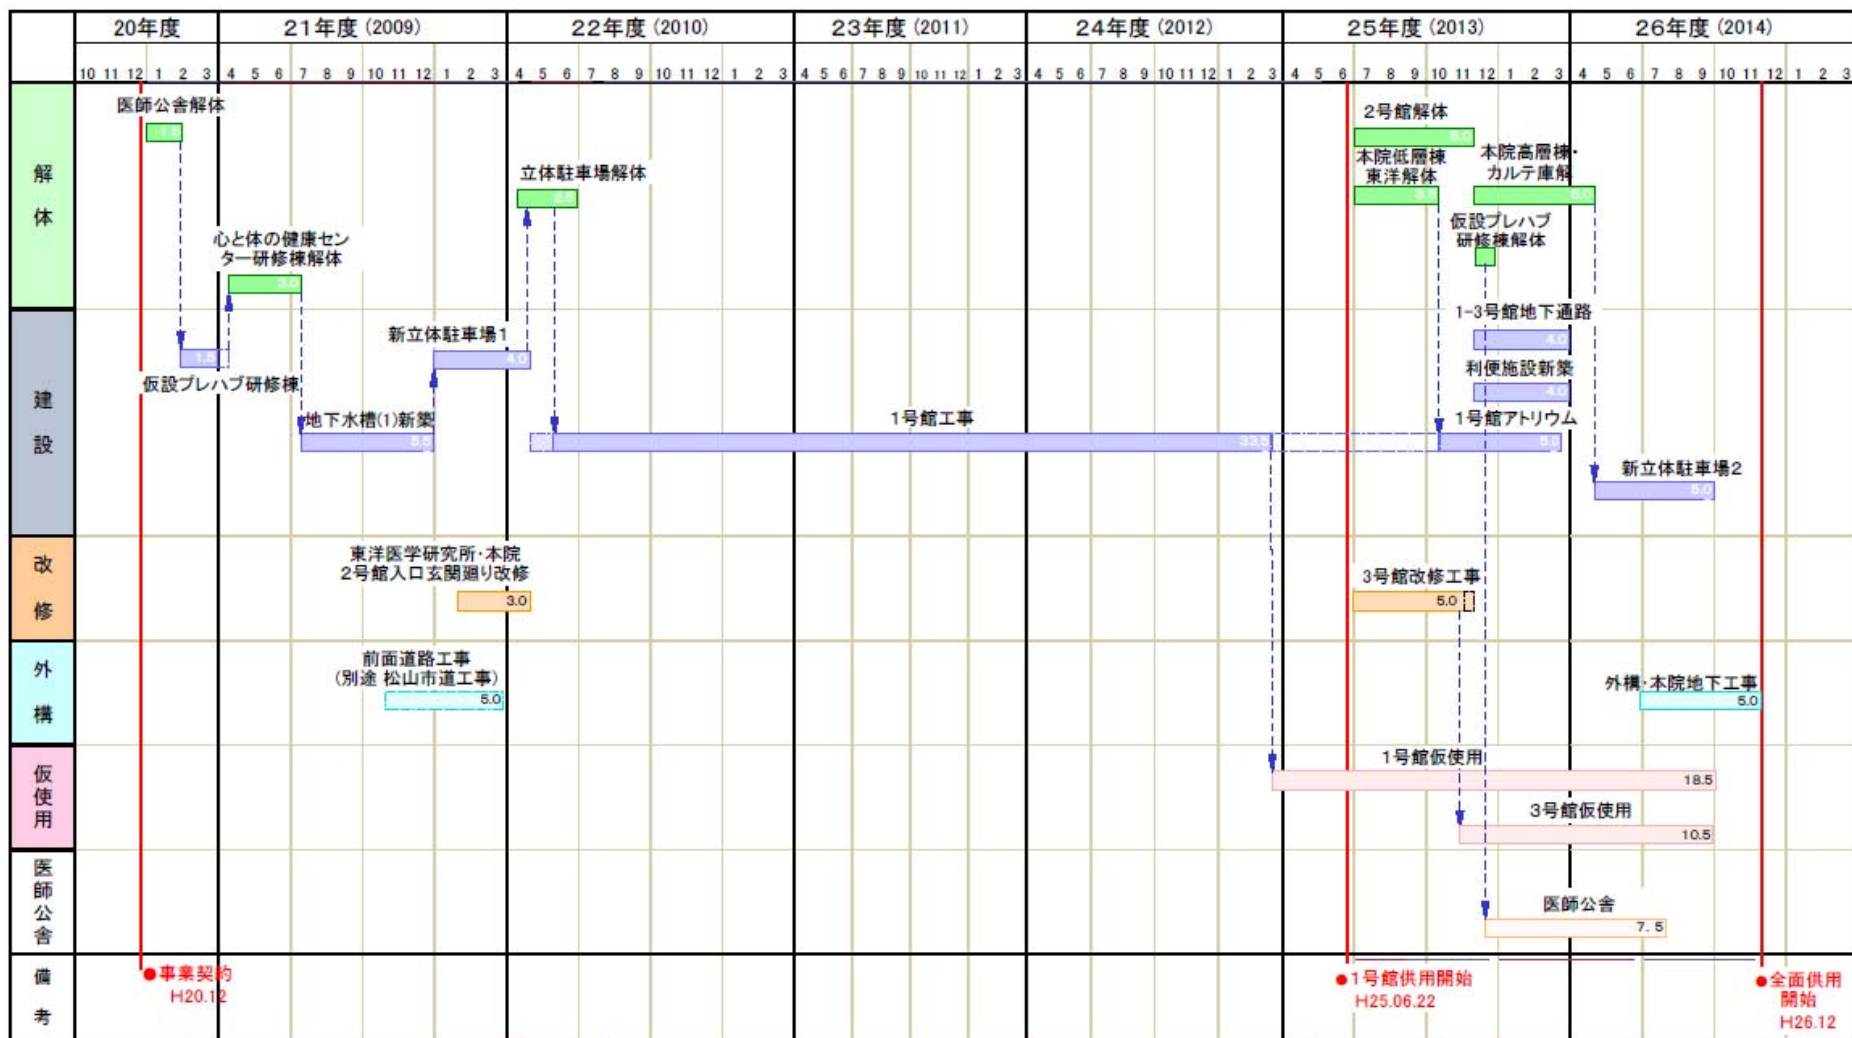



(2) 1号館新築工事の着工について

■ 1号館新築工事の着工について(着工時工程表)

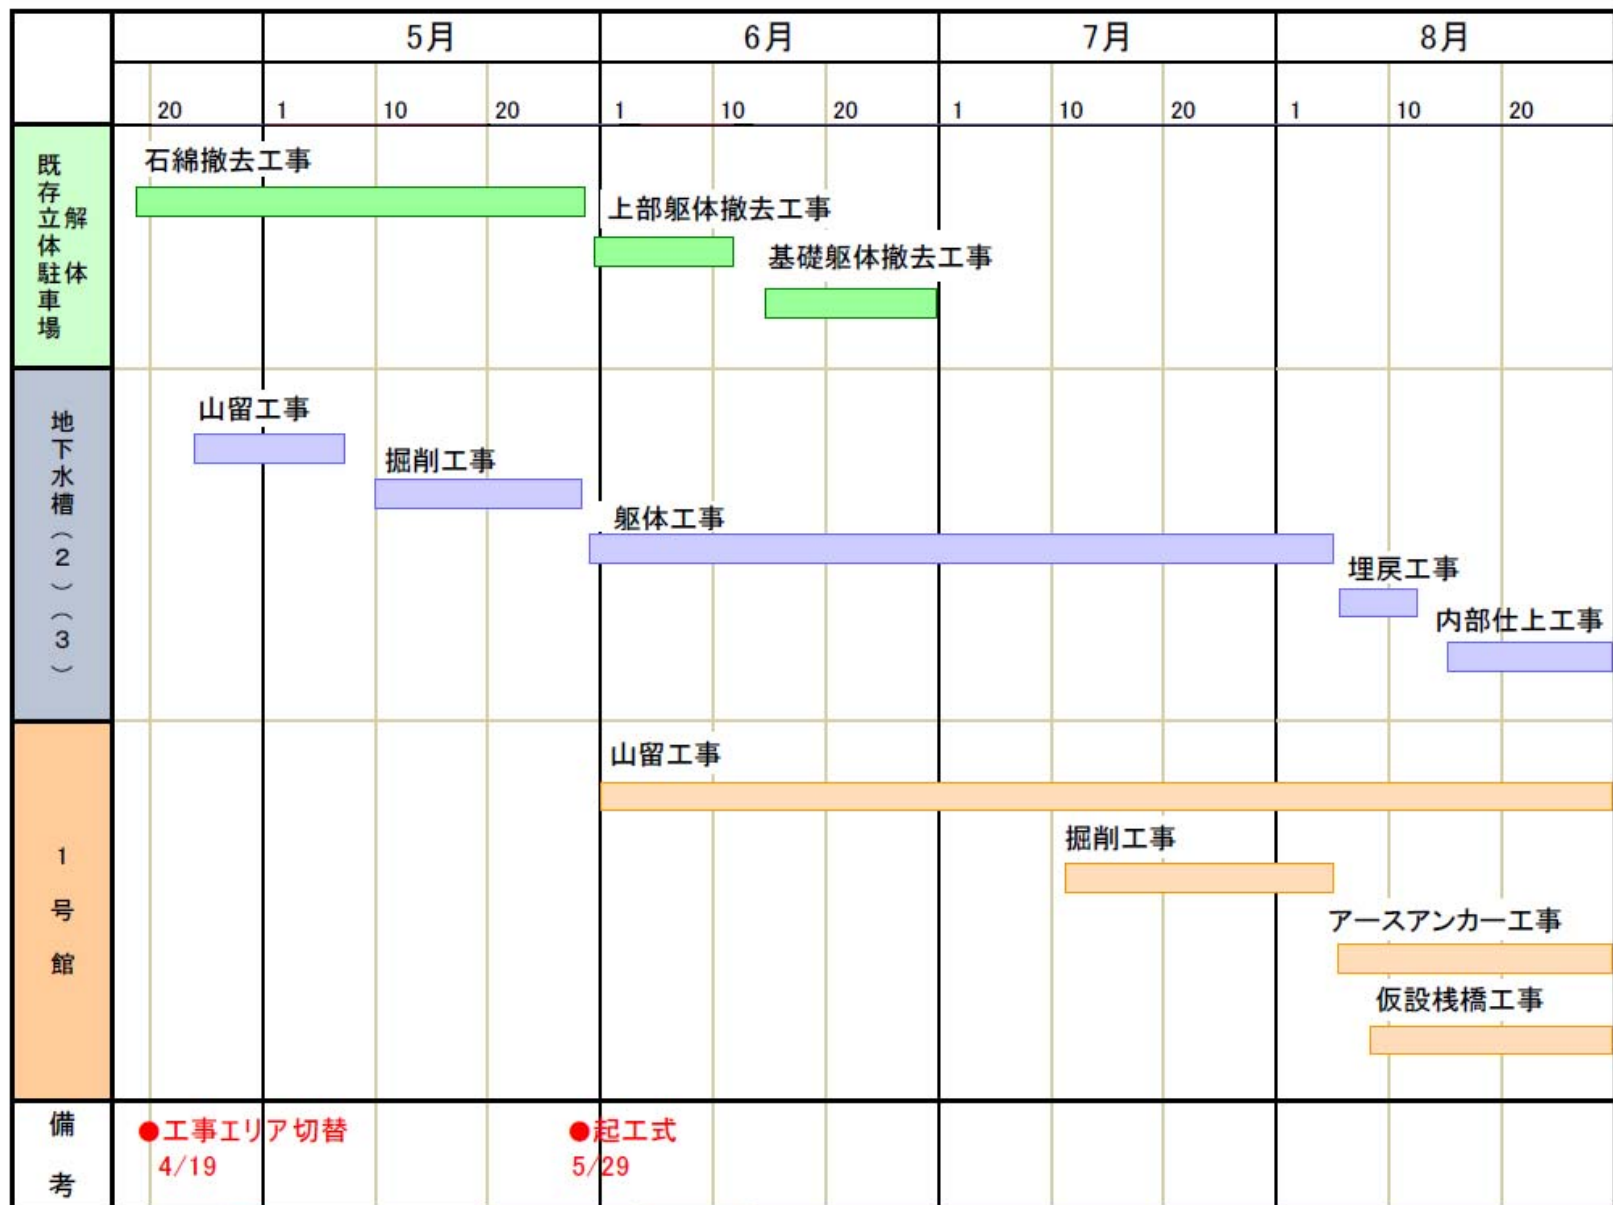

■ 1号館新築工事の着工について(仮設計画)

入退場ゲート

西側道路に2箇所、北側道路に1箇所設置

地下

山留 SMW工法(アースアンカー使用)

資材搬入用仮設構台設置

地上

タワークレーン 2機設置


■ 1号館新築工事の着工について(SMW工法)

SMW工法の特徴


「高い遮水性」

地下を掘削する周囲をセメントと土によって作られる「連続一体型の遮水壁」で囲うため、在来山留工法に比べ遮水性にすぐれています。


⇒ 地盤沈下や地下水位の低下を防ぎます

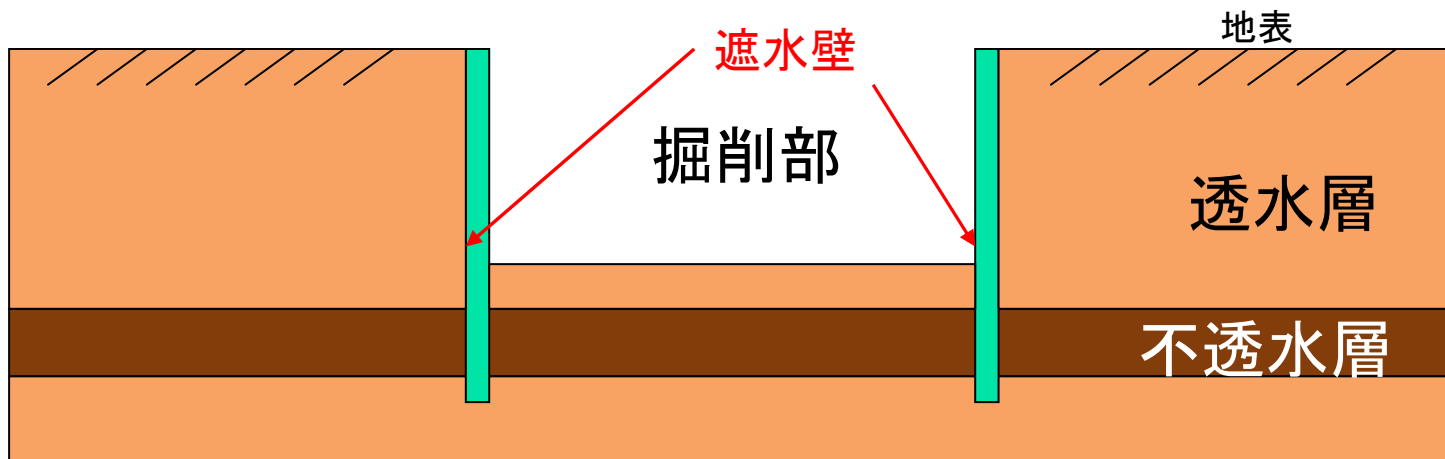


■ 1号館工事(地下)

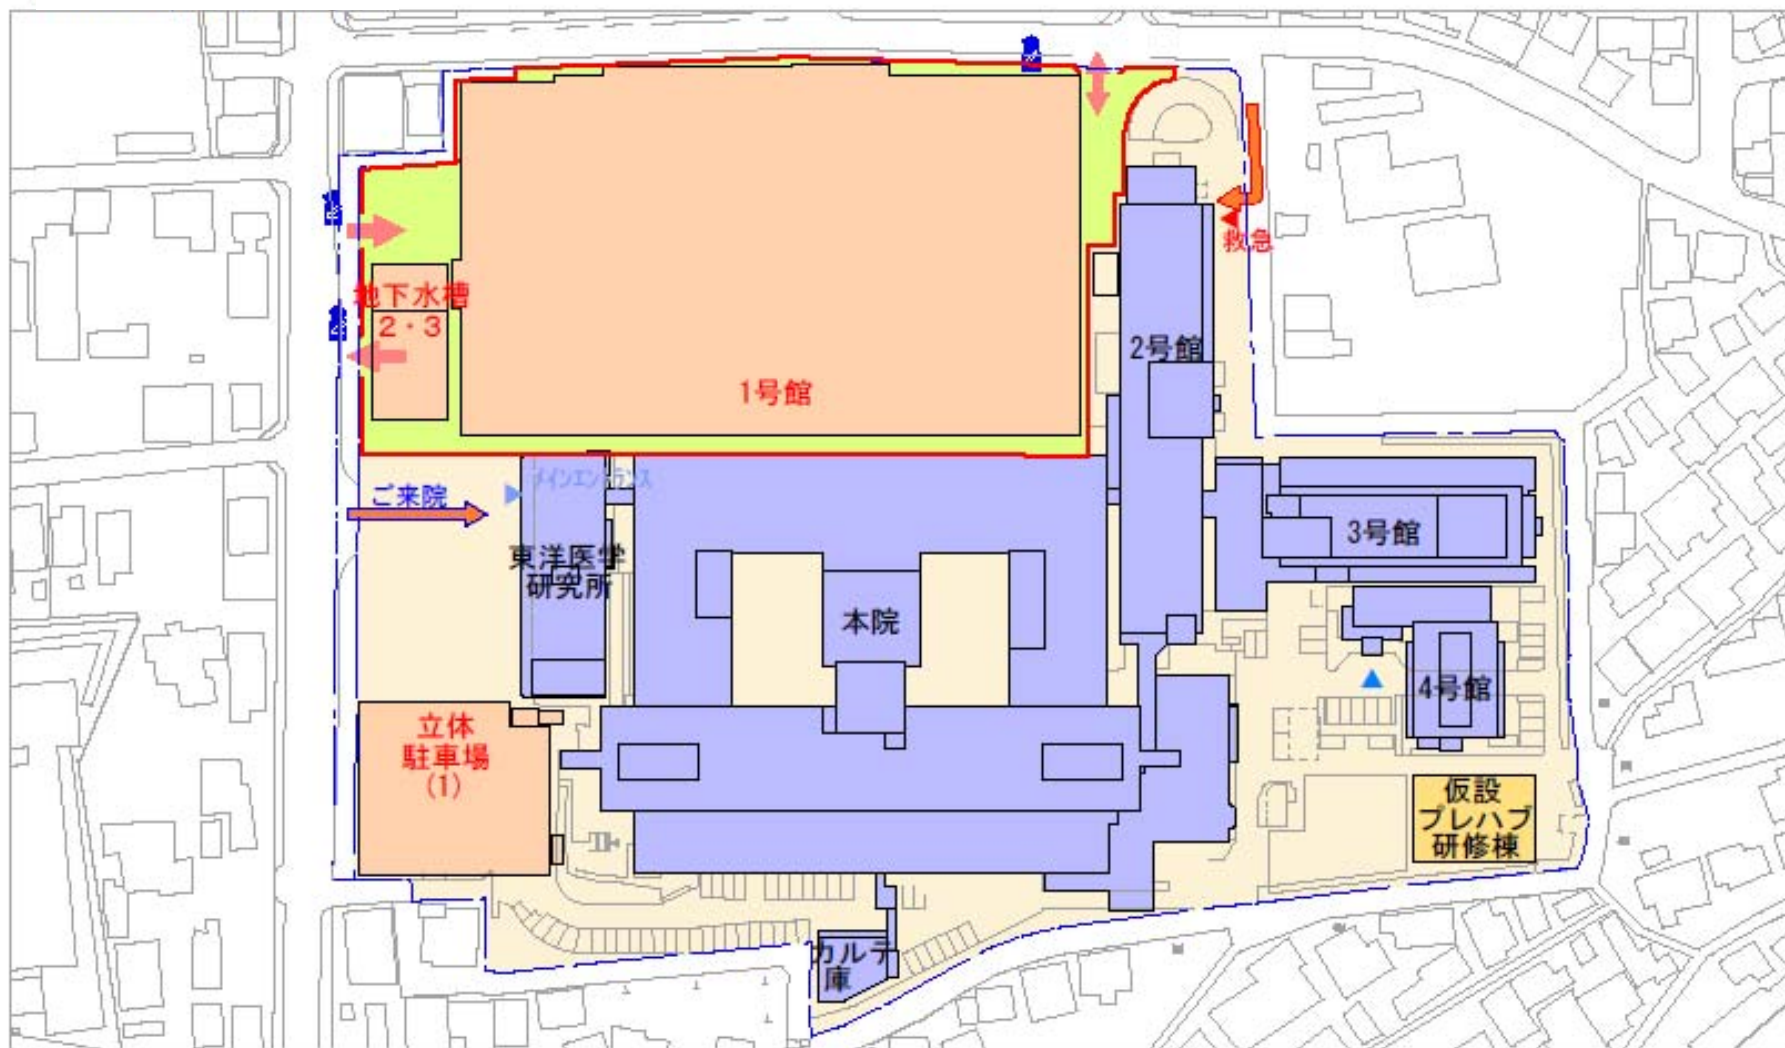

■ 1号館工事(地上)

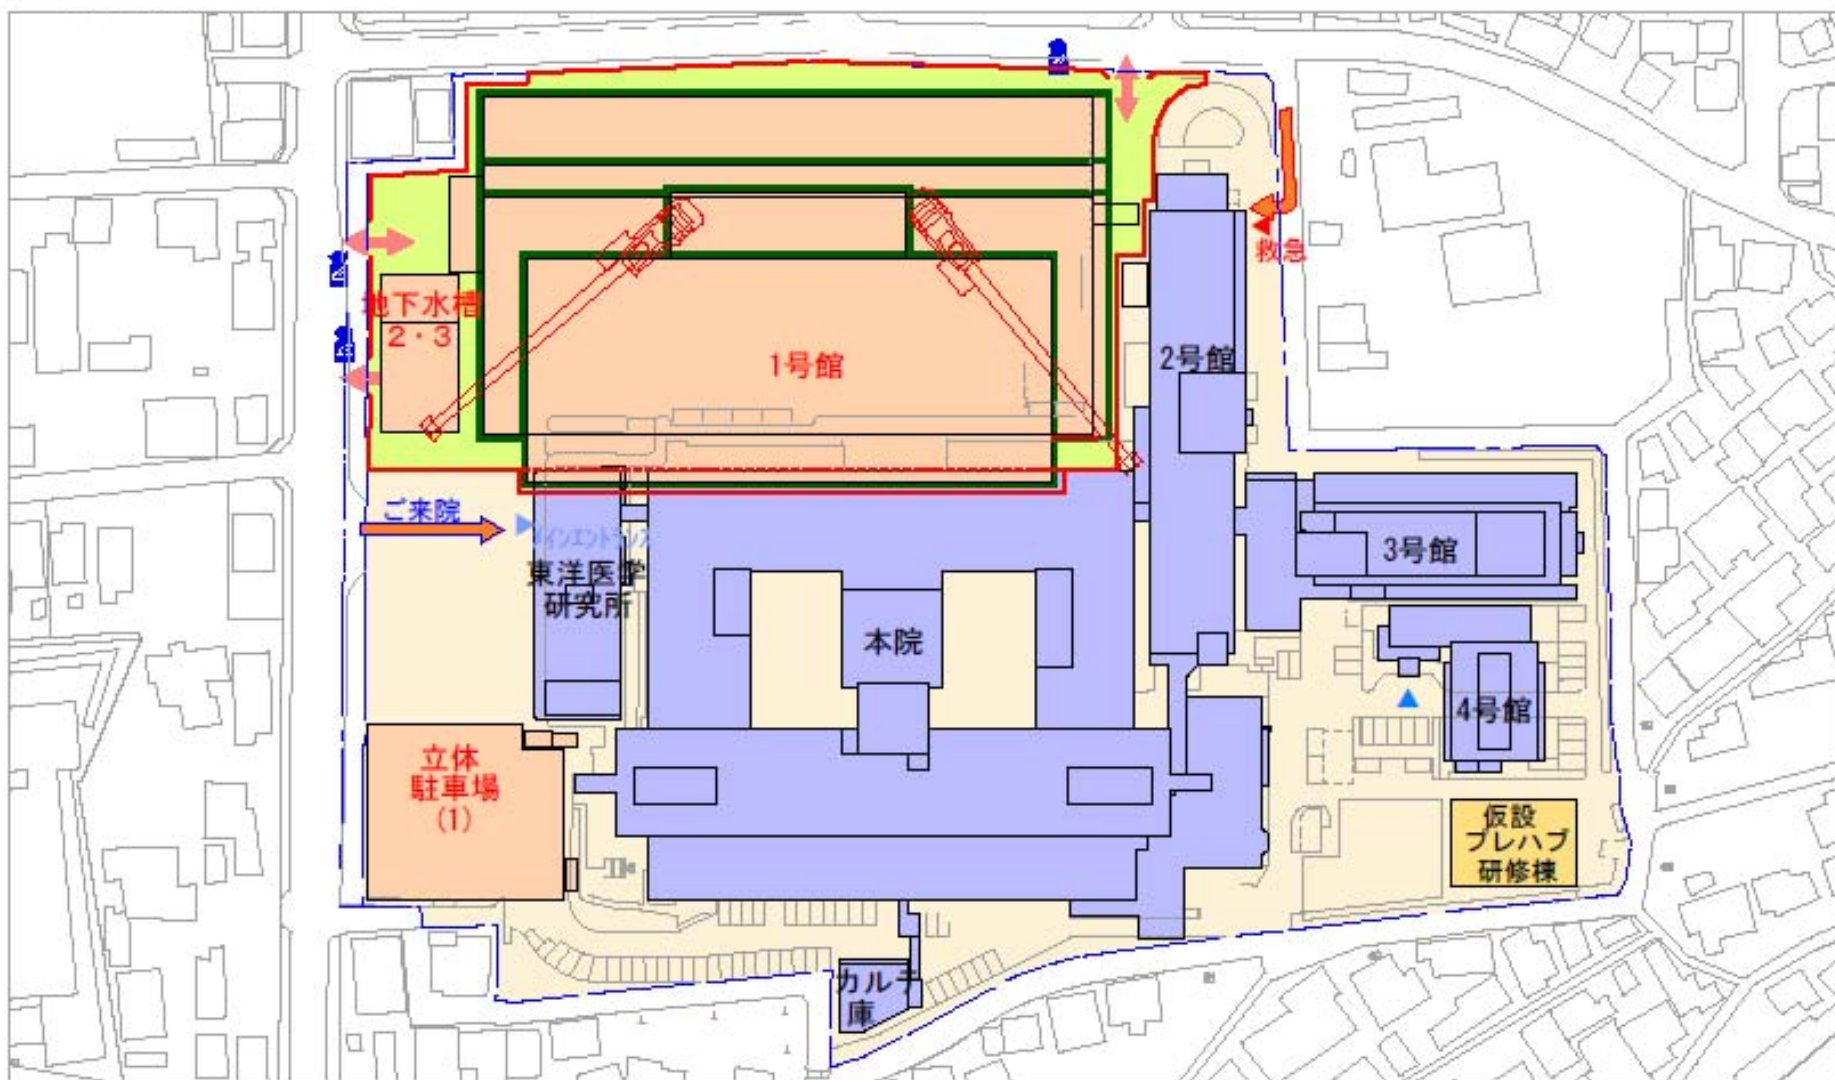

■1号館新築工事の着工について(大型工事車両動線)

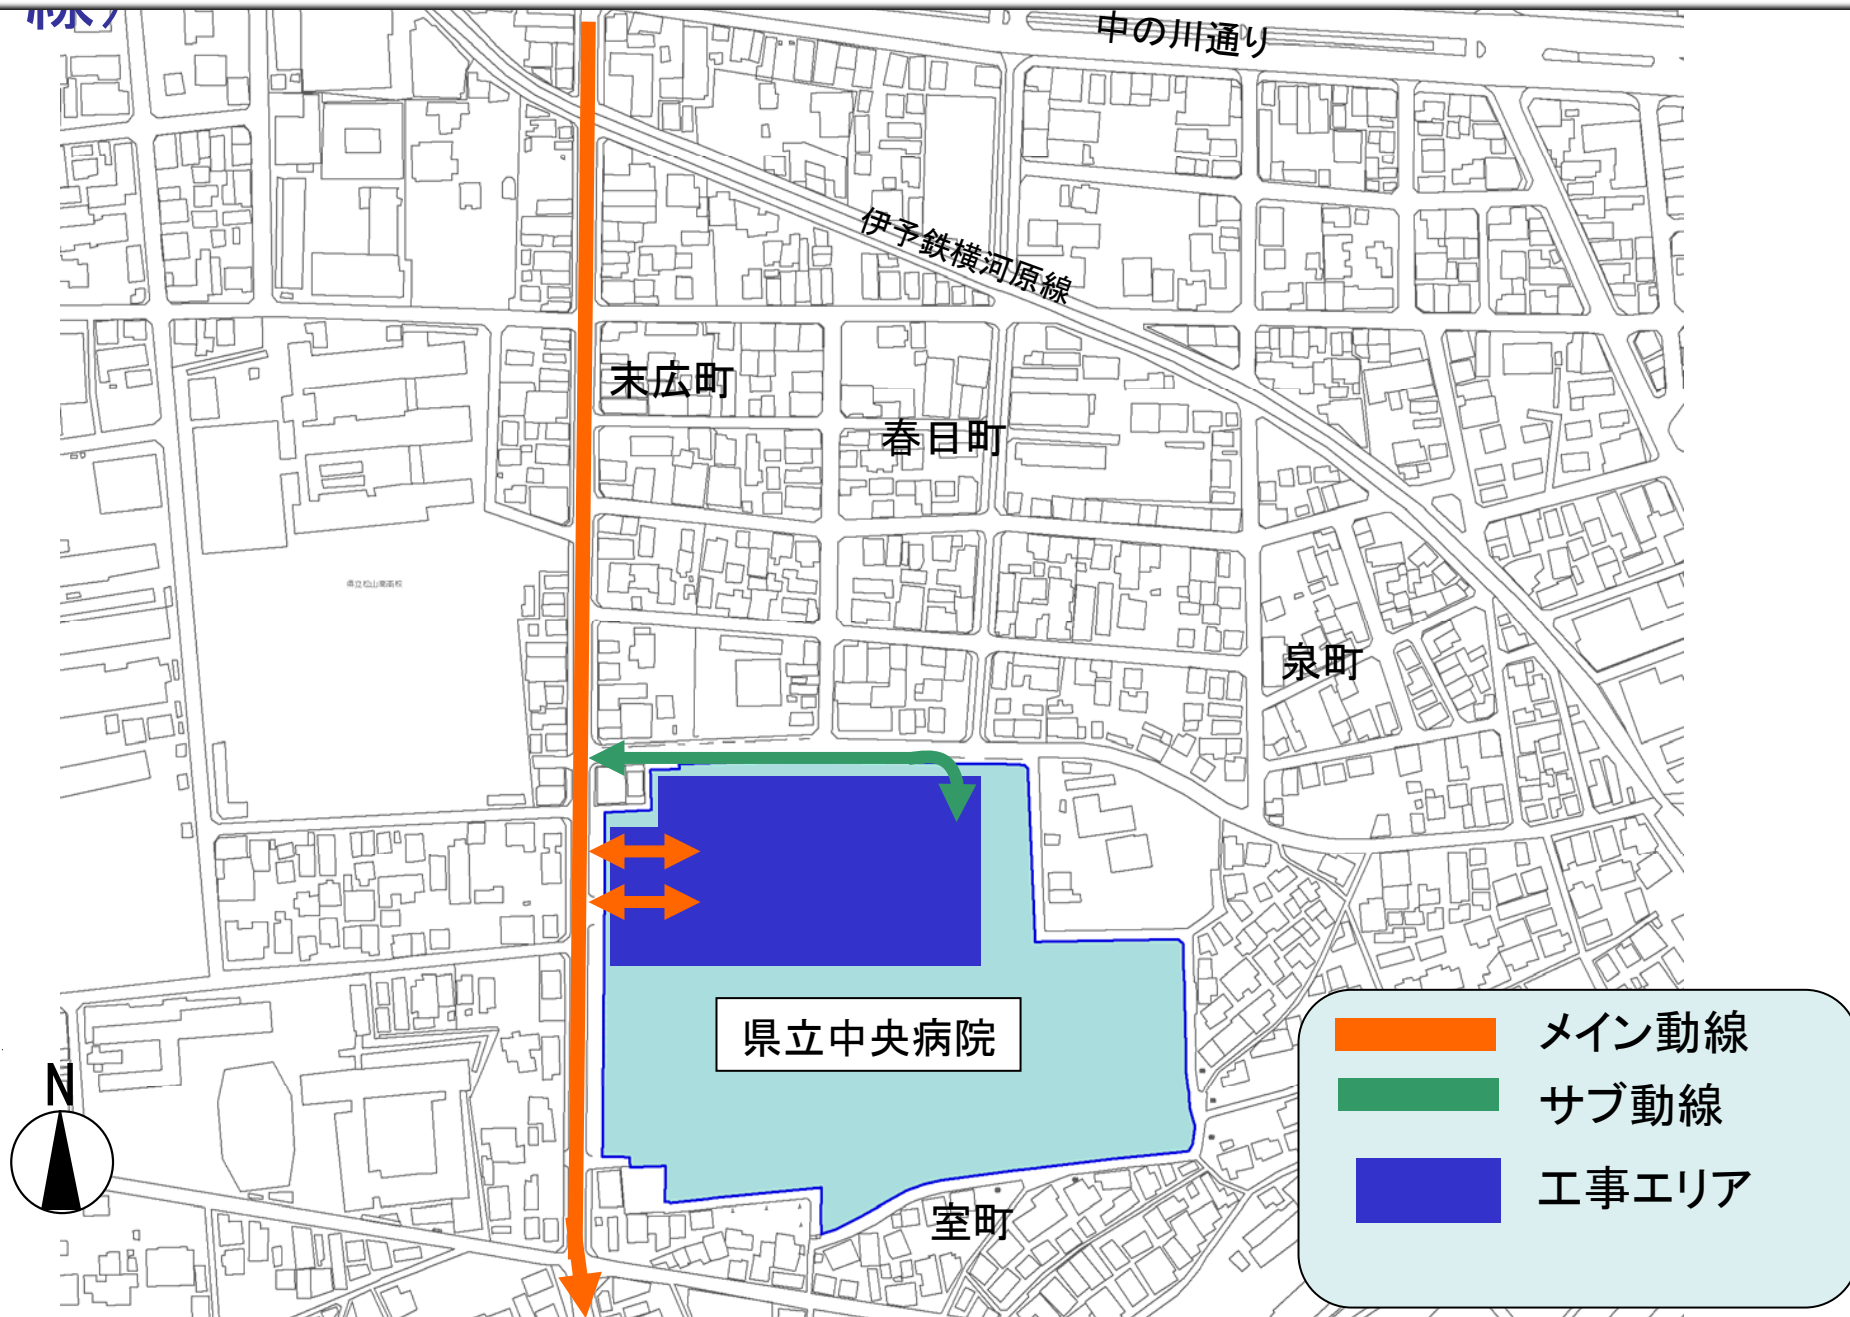

■大型工事車両の動線について


①原則：北から南

- ・搬入車両 市駅方面から南下し左折入場
- ・搬出車両 左折退場し石手川の土手まで抜ける

②超大型トレーラーにて搬入する資材

- ・渋滞時間を避け、早朝・深夜に搬入
- ・南側（石手川方面）からも搬入（ルート of 安全確保上必要な場合）

※ 今後も随時連絡協議会を開催し協議を継続してまいります



(3) その他

■立体駐車場(1)の使用開始について

2010年4月17日(土)午前7時をもって、現在の立体駐車場は利用を停止し、新たに出来た「立体駐車場(1)」が使用開始となります。

